



LA DÉFENSE  
DEFENSIE



PRIORITÉ À LA PAIX  
VOORRANG AAN VREDE

# Réunion Tech Vergadering

1/2021

CCB – 08 - BOC

24 Fev 21





# Présences / Aanwezigheden

## Presenters (5)

---

- Choubane Housene
- ⊖ Neukelmance Thierry
- Serra Michael
- Smekens Marc
- Wéry Thomas

## Attendees (1)

---

- 👤 Karien Sempels Guest



## Comd Qu / Kw Comd



In afwachting van KKE New moeten het welzijn en de veiligheid van het Pers KKE verzekerd blijven.

Continue uitgaven zullen zo besteed worden.

Gezien de leeftijd van de installaties en het gebrek aan Pers is de reactietermijn soms langer dan gewenst.

De rol van de POC Infra is essentieel om onze Infra Ops te behouden: elk probleem moet opgemaakt worden aan de hand van een WO.

Le confort et la sécurité du personnel QRE doit continuer à être assurés en attendant le QRE New.

Des dépenses continues seront donc consenties.

Vu la vétusté de l'infrastructure et le manque de personnel, le temps de réaction est souvent bien plus long que souhaité.

Le rôle des POC Infra est essentiel afin de garder notre Infra Ops: tout problème doit faire l'objet d'un WO.



# Pers Infra



1. 1<sup>er</sup> Ech Infra
  2. 2<sup>e</sup> Ech Infra
- Sit Pers critique

## Planning 2021

Le CHOD a clairement repris dans ses priorités l'appui TSS aux unités. Le 1Ech Infra d'EVERE fait partie de ces priorités.

Cdt TURBANG fera mutation OUT – ?DTG?



# CCB08 / RTech / BOC08

## Ordre du jour / Dagorder



1. Ventilatiesysteem PHD-DG StratCom
2. Verlichting Kwartier
3. Verlichting fietsen- en motorstallingen
4. Verkeersplan
5. Renovatie Pk moto-fiets (4B-C)
6. Sanitaire well being Plan
7. Verzekering plafond
8. Kw douches
9. Renovatie van de kleedkamers Blok 8
10. Wp fiches
11. Drinkbaar water
12. Airco bloc 13
13. Chauffage Qu
14. Tour de table

1. Système ventilation PHD-DG StratCom
2. Eclairage Quartier
3. Abris vélos & motos
4. Plan de circulation
5. Rénovation Pk moto-vélo (4B-C)
6. Plan well being sanitaire
7. Sécurisation des plafonds
8. Douches Qu
9. Rénovation des vestiaires bloc 8
10. Fiche At
11. Eau potable
12. Airco bloc 13
13. Chauffage Qu
14. Tour de table



1

# Ventilatie/Ventilation PHD DG Strat Com




1. Contrat:
2. BUT:
3. DTG: Fev 19
4. Firme: VEOLIA
5. POC: Adjt CAUTAERTS
6. Remarque:
  - a. Mise en service à effectuer
    - i. Mode d'emploi N/F à recevoir
    - ii. Certificat CE à recevoir



**Plus nécessaire – PHD – Niet meer nodig**  
**Contact pris avec - DG StratCom / Infra - Contact genomen met**  
**? SDV ?**

# Eclairage Qu – Kw verlichting

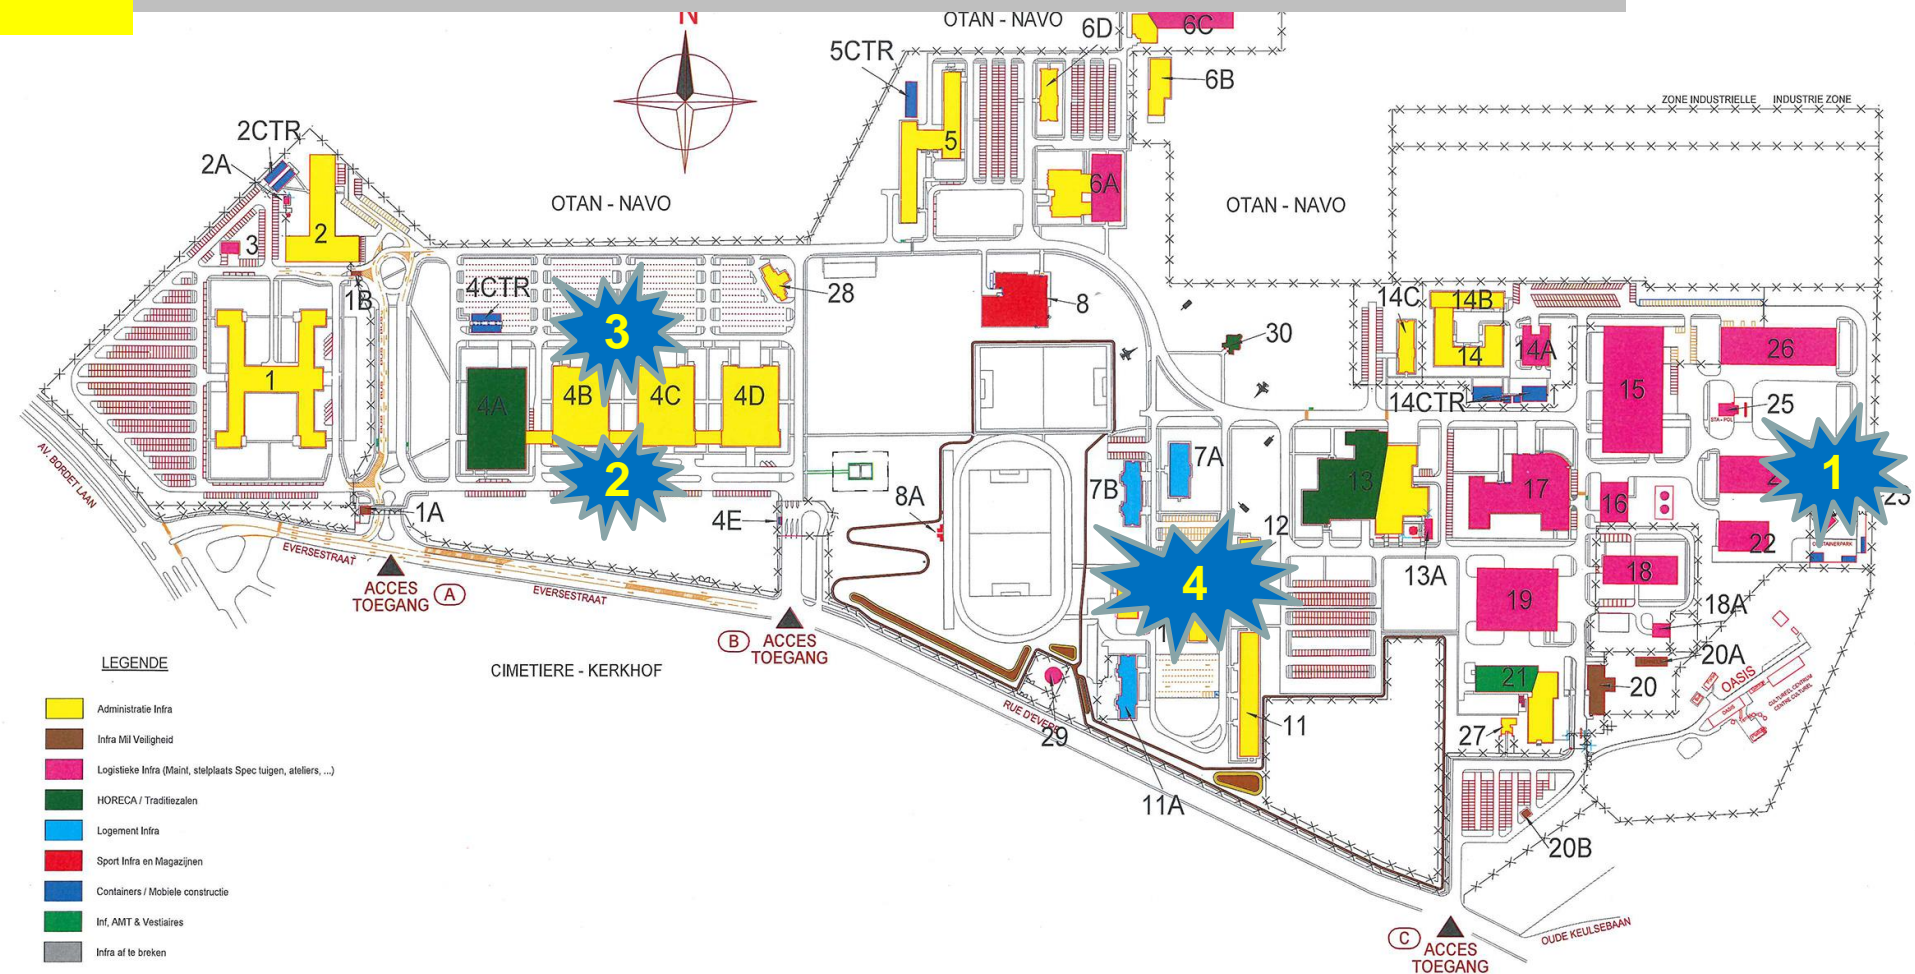


Pt de Sit – StaVaZa  
60 lampes InOps  
Utilité/Nuttigheid TBC

**Prio Comd Qu/Kw Comd**

1. Périmètre Qu / Kw perimeter
2. Accès / Toegang A-B-C
3. Rue / straat 4A-B-C-D

3

# Rokers/fiets/motorstallingen Abris vélos/motos/fumeurs

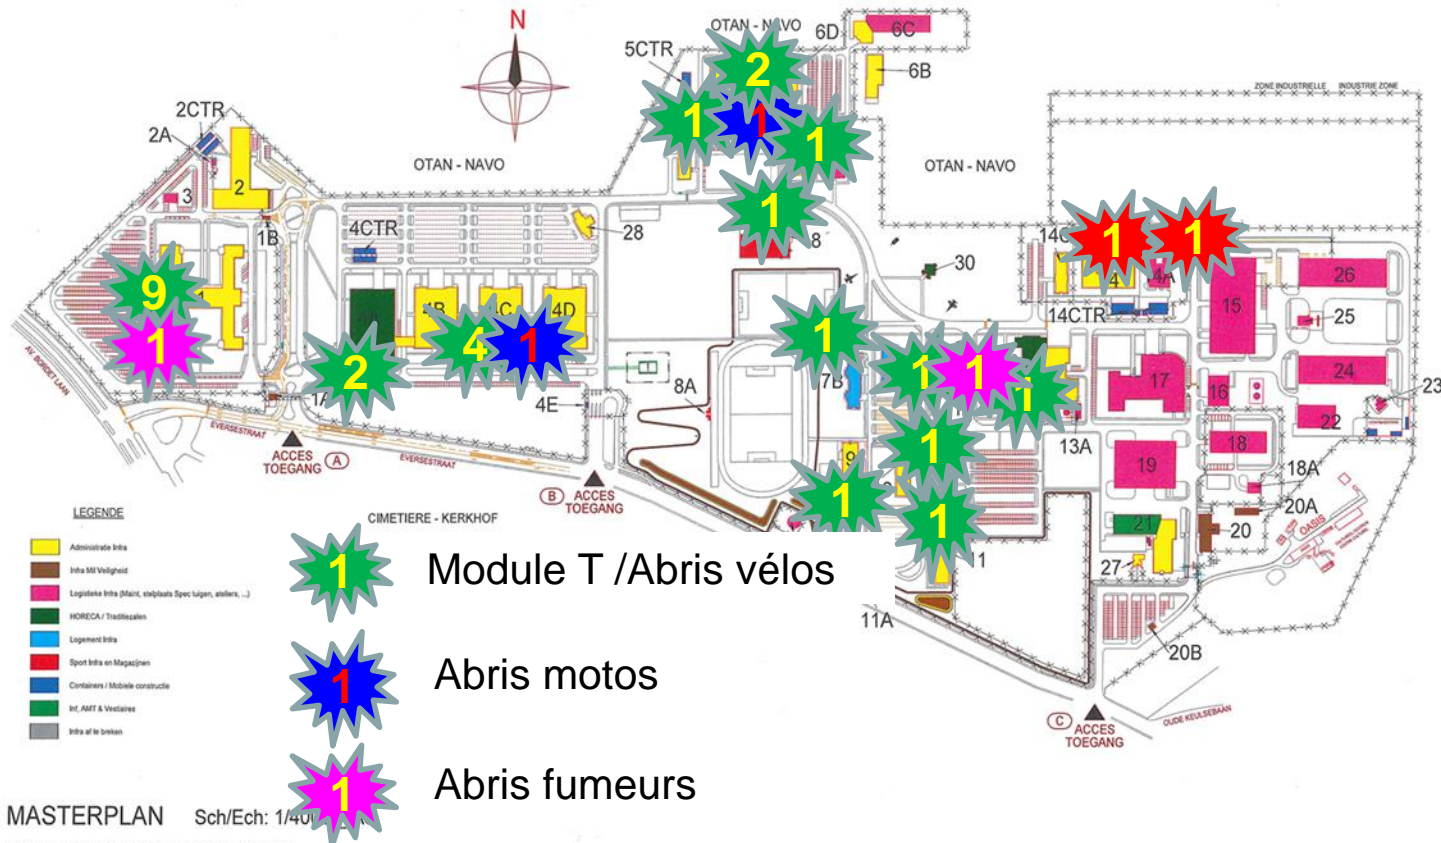


Aantal fietsstallingen – 26 - Nombre d'abris vélos  
Aantal moto stallingen- 2 – Nombre d'abris motos



# 4

# Circulation Qu / Verkeer Kw

**+/- 800 Veh/Pers / jour  
Sp site Justitia**

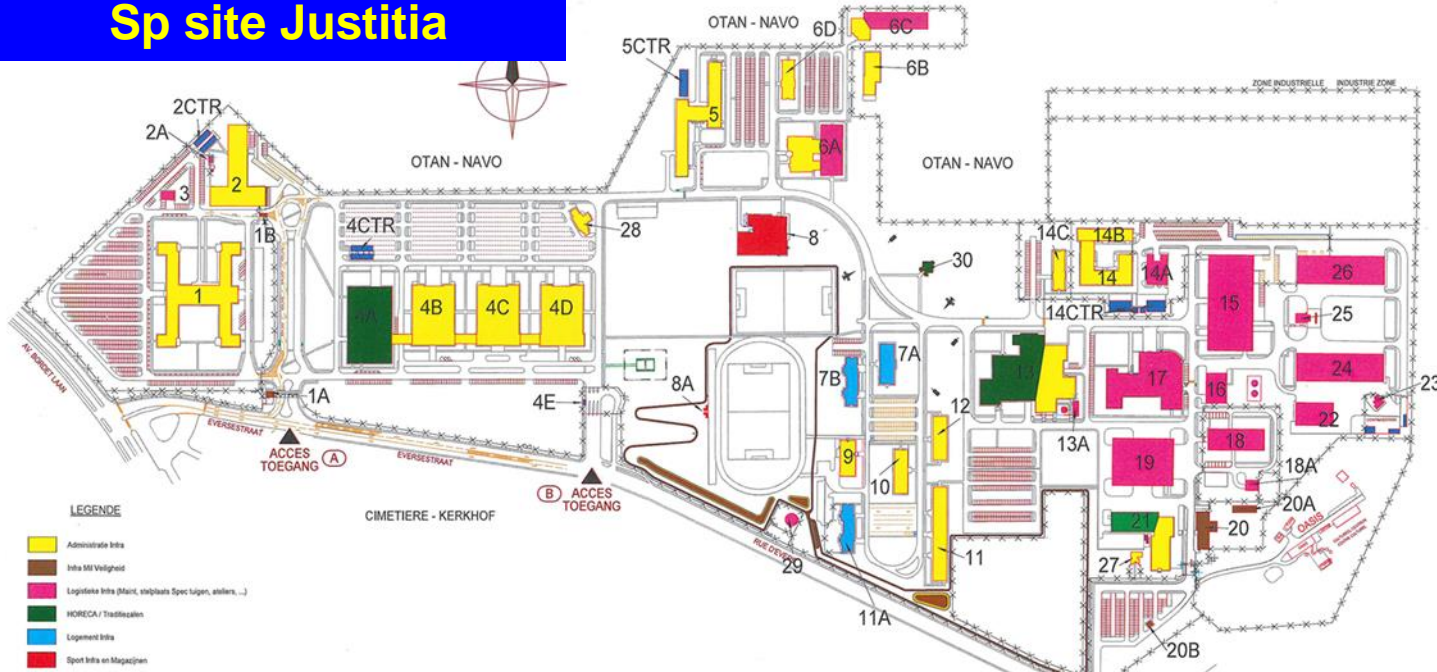

**LEGENDE**

- Administratie Intra
- Intra Mil Veiligheid
- Logistieke Intra (plaat, vliegveld Spec lügen, anfers...)
- HORECA / Truistassalen
- Logement Intra
- Sport Intra en Magazijnen


**Accès BRAVO  
Marquage routier : +/- OK**

**Toegang BRAVO  
Wegmarkering: +/- OK**

5

# Fiets/motostallingen 4BC (vélos) – 4CD (motos) abris vélos/motos

Inrit/afrit  
4BC

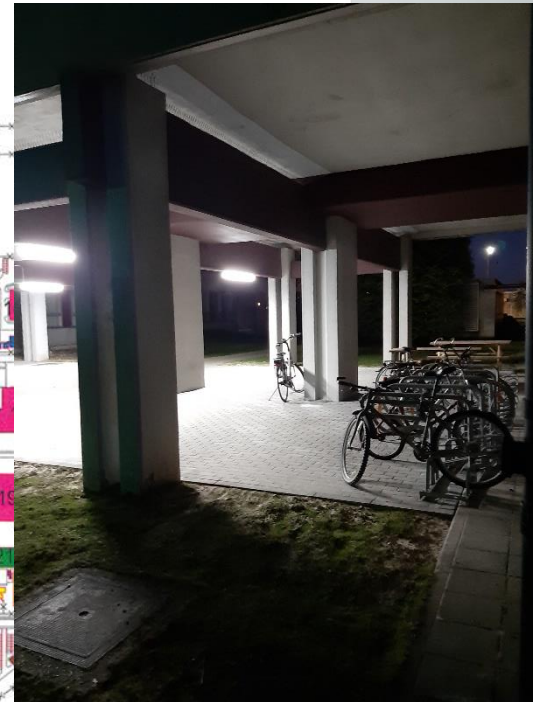



**6**

# Kw Sanitaire Qu



## **1. Bloc 1: Colonnes B –F**

- a. 01 Mar 21**
- b. 240 JO**

## **2. Bloc 4 B-C-D: Evac WC gauche (1-2-3 Et)**

- a. Etude**
- b. Exécution**

- **Fait: BM 7A – 9 – 10 – 11 (RDC+sanitaires) – 13**
- **BM 11 (R+1, R+2, R+3 aile gauche, R+3 aile droite) :**
  - Courant 2021
  - ACOS IS?
- **BM 14B**
  - RDC **fait SAUF local CDOC**
  - Une partie commandée en 2019 (Niv +1) – **Exécution en cours**
- **BM 14**
  - +1 Rénovation intérieure
  - 01 Mar 21 – 194 JO

## Tout ceci sous réserve de

- **Dégradation éventuelle (Vigilance U / Ctl 1<sup>er</sup>/2<sup>e</sup> Ech Infra)**
- Disponibilité budgétaire
- Disponibilité contractuelle
- Pas d'autres priorités urgentes

## Plan d'action

1. Inventaire Qu.
2. Ctl de l'opérationnalité par l'intermédiaire des POC Infra.
3. Les réparations seront effectuées par le 2<sup>e</sup> Ech.
4. Ctl légionellose sera effectué par VEOLIA (2020)
5. Ctl légionellose planifié par TPF: Lu 01 Mar 21
6. CR sur ShP SLPPT08:  
[https://units.mil.intra/sites/DGHWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/analysis.aspx](https://units.mil.intra/sites/DGHWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/analysis.aspx)
7. Le petit Mat sera mis en place.
8. Le plan de nettoyage sera adapté.
9. « Publicité »

9

# Tvx Bloc Nr 8

1. Contrat: OOR – WO 47191422
2. BUT: Rénovations douches et vestiaires

SACO					
1	2	3	4	5	6
			25Jan21		

3. DTG: Date début chantier 19Avr21 - 150JO
4. POC: CC-Infra-EVZ – Adjt Buyle C.
5. Firme: IN ADVANCE
6. Planning/A faire:
  - a. Connexion
  - b. Sécurité
  - c. Attestation
  - d. Documentation MTE
7. Incidences + Mesures de Coord (ok)
8. PV:




10

# Fiche At



❖ **Composiet (blok 14)**  
**ACOS IS**

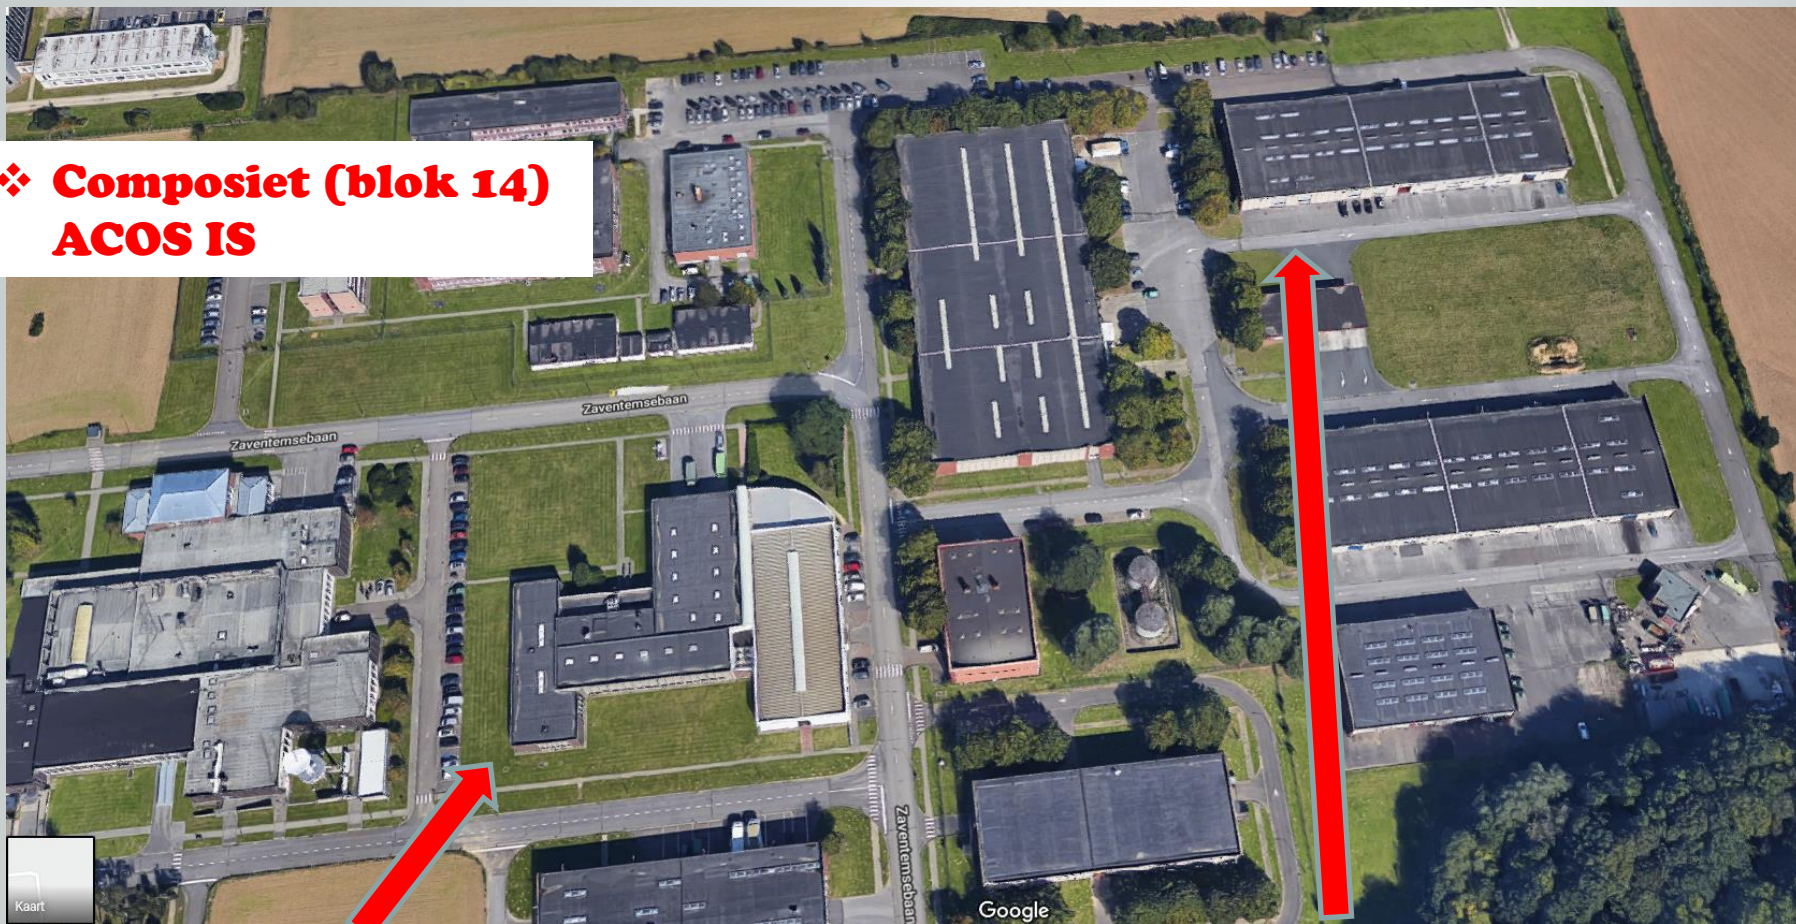

❖ **Drukkerij (blok 17)**  
**DG Str COM.**

❖ **Garage (blok 26)**  
**ACOS IS.**

In loop E / En cours U



# 11

## Problématique eau potable

1. Ctl Min
  - a. UN point d'eau par bloc
  - b. UN point par cafetaria
2. Exécution NLT 30 Avr 21
3. CR sur ShP SLPPT08

[https://units.mil.intra/sites/DGHWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/analysis.aspx](https://units.mil.intra/sites/DGHWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/analysis.aspx)

1. Min te Ctl
  - a. EEN waterpunt per blok
  - b. EEN waterpunt per cafetaria
2. Uitvoering NLT 30 Apr 21
3. CR op ShP LDPBW08

[https://units.mil.intra/sites/DGHWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/analysis.aspx](https://units.mil.intra/sites/DGHWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/analysis.aspx)

# Bloc 13

## Airco/Infiltration eau

Le CTA (central de traitement d'air) en toiture est opérationnel et fonctionne.

Il faut savoir que les plaintes de froid dans le bloc 13 partie hélios sont dues à :

- Le non fonctionnement de certain CTA des bureaux

**2e Ech Infra + CC Infra**  
**Update U**

- dans chaque bureaux il y a des petits CTA qui font l'appoint en chaleur et en froid.

# 13 Chauffage Qu – Verwarming Kw

Chauffage QRE: Ops (Ma 25 Fev 19)

**2e Ech Infra + CC Infra  
Update U**



DEFENSIE  
LA DÉFENSE

# KKE: toekomst problematiek verwarming



07/12/20


Lt Jens VAN GYSEGHEM

OTAN - NAVO

OCM

1	I	60.000 m <sup>2</sup>	D - E	W	X	225.000 ltr	B - E
2	II	20.000 m <sup>2</sup>	D - E	W	X	225.000 ltr	B - E
4A	IV	5.000 m <sup>2</sup>	D - E	3	XI	10.000 ltr	O - D
4C	V	60.000 m <sup>2</sup>	D - E	1/4	XII	10.000 ltr	O - D
4C	VI	60.000 m <sup>2</sup>	D - E	4C	XIII	10.000 ltr	O - D
Meten	VII	3.000 m <sup>2</sup>	B - E	15	XIV	5.000 ltr	O - D
				15	XV	4.500 ltr	B - D


ZONE INDUSTRIELLE  
INDUSTRIE ZONE

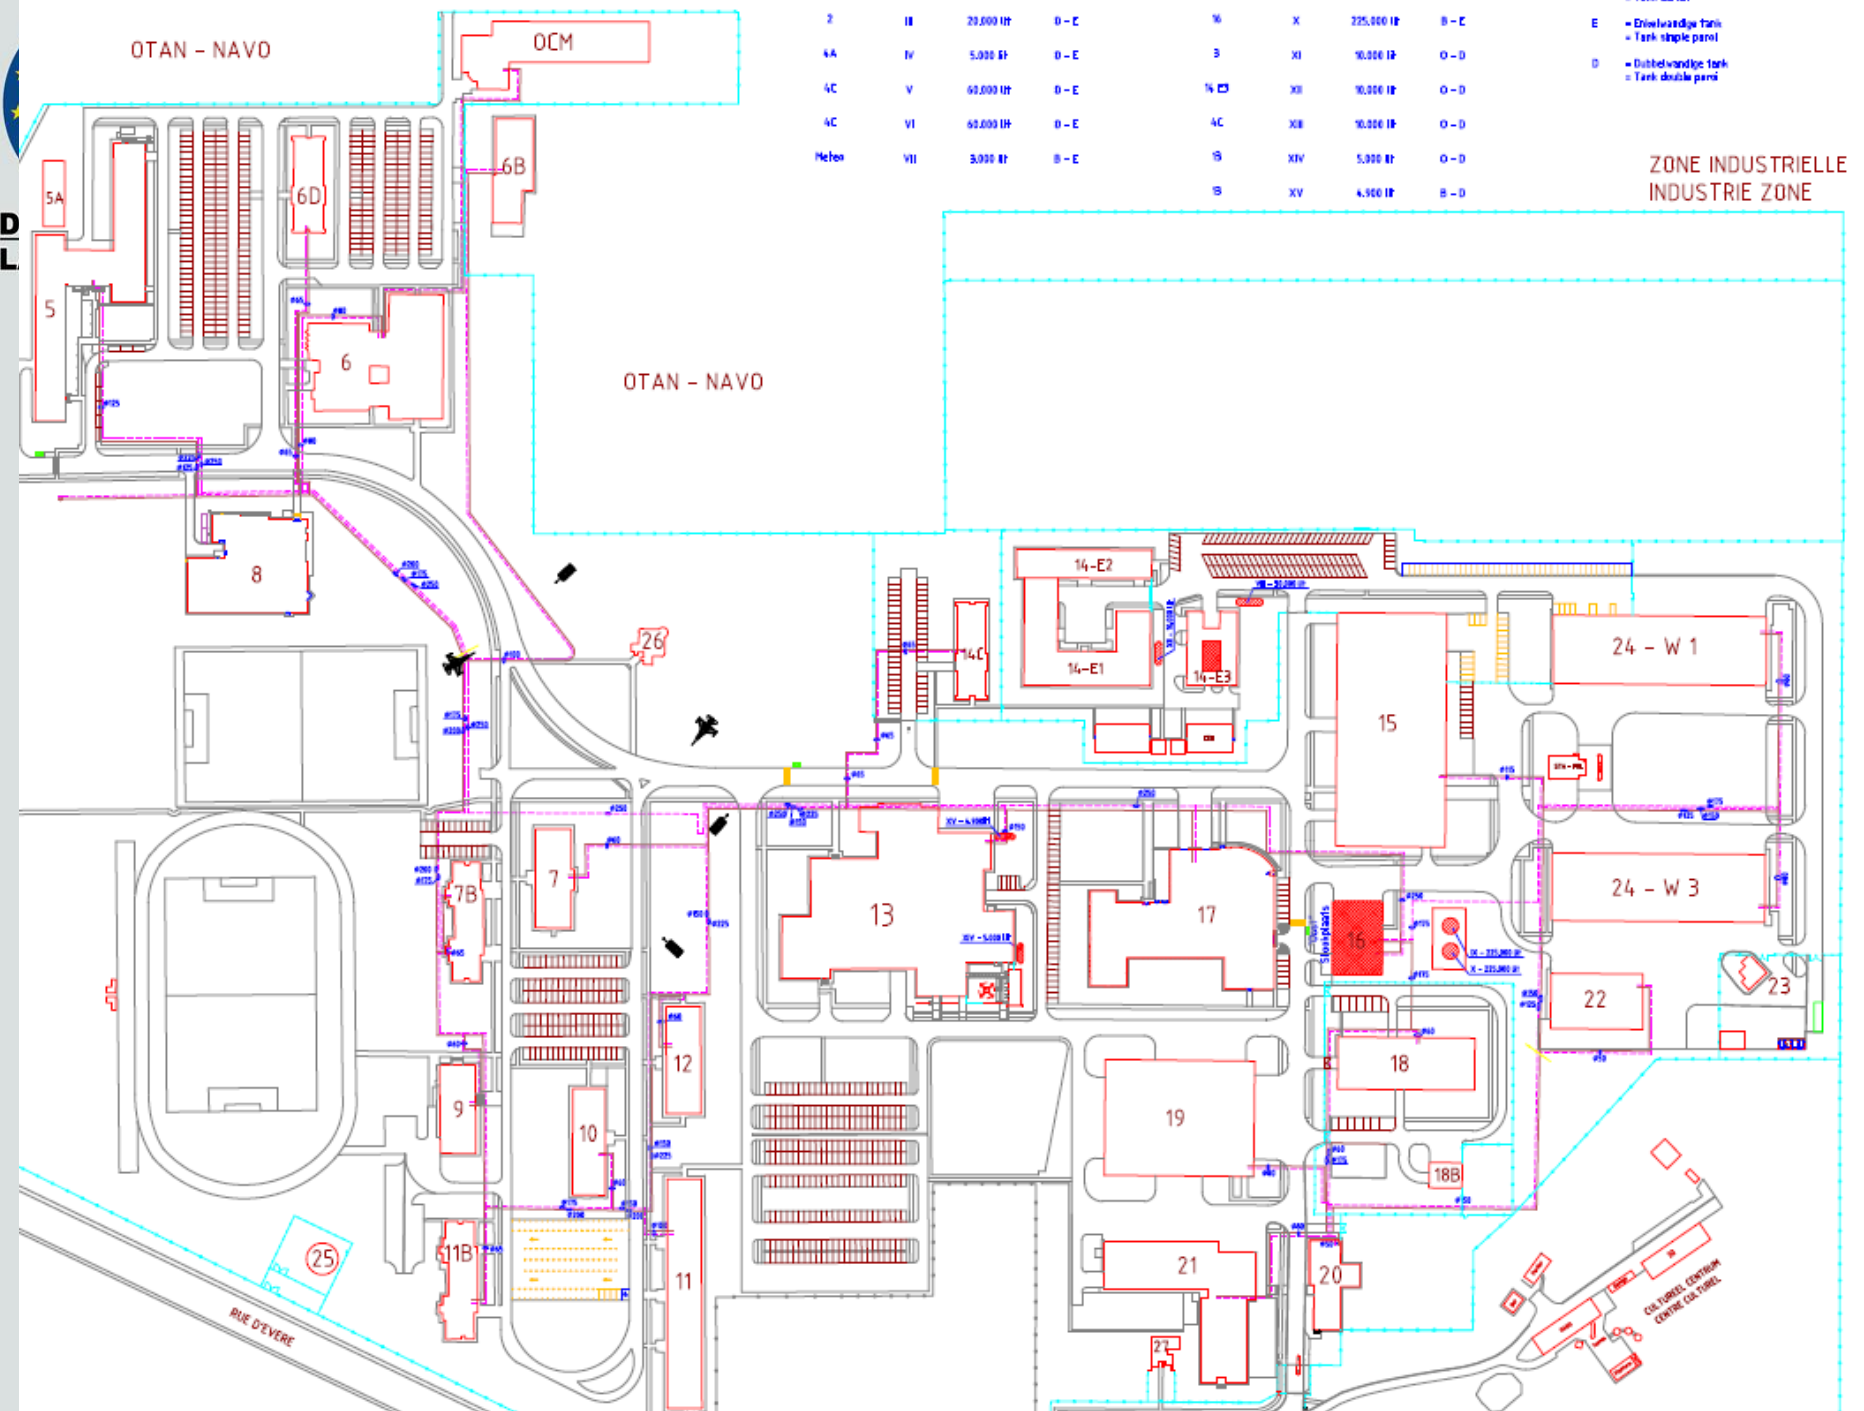

VIWA




# Plan van aanpak

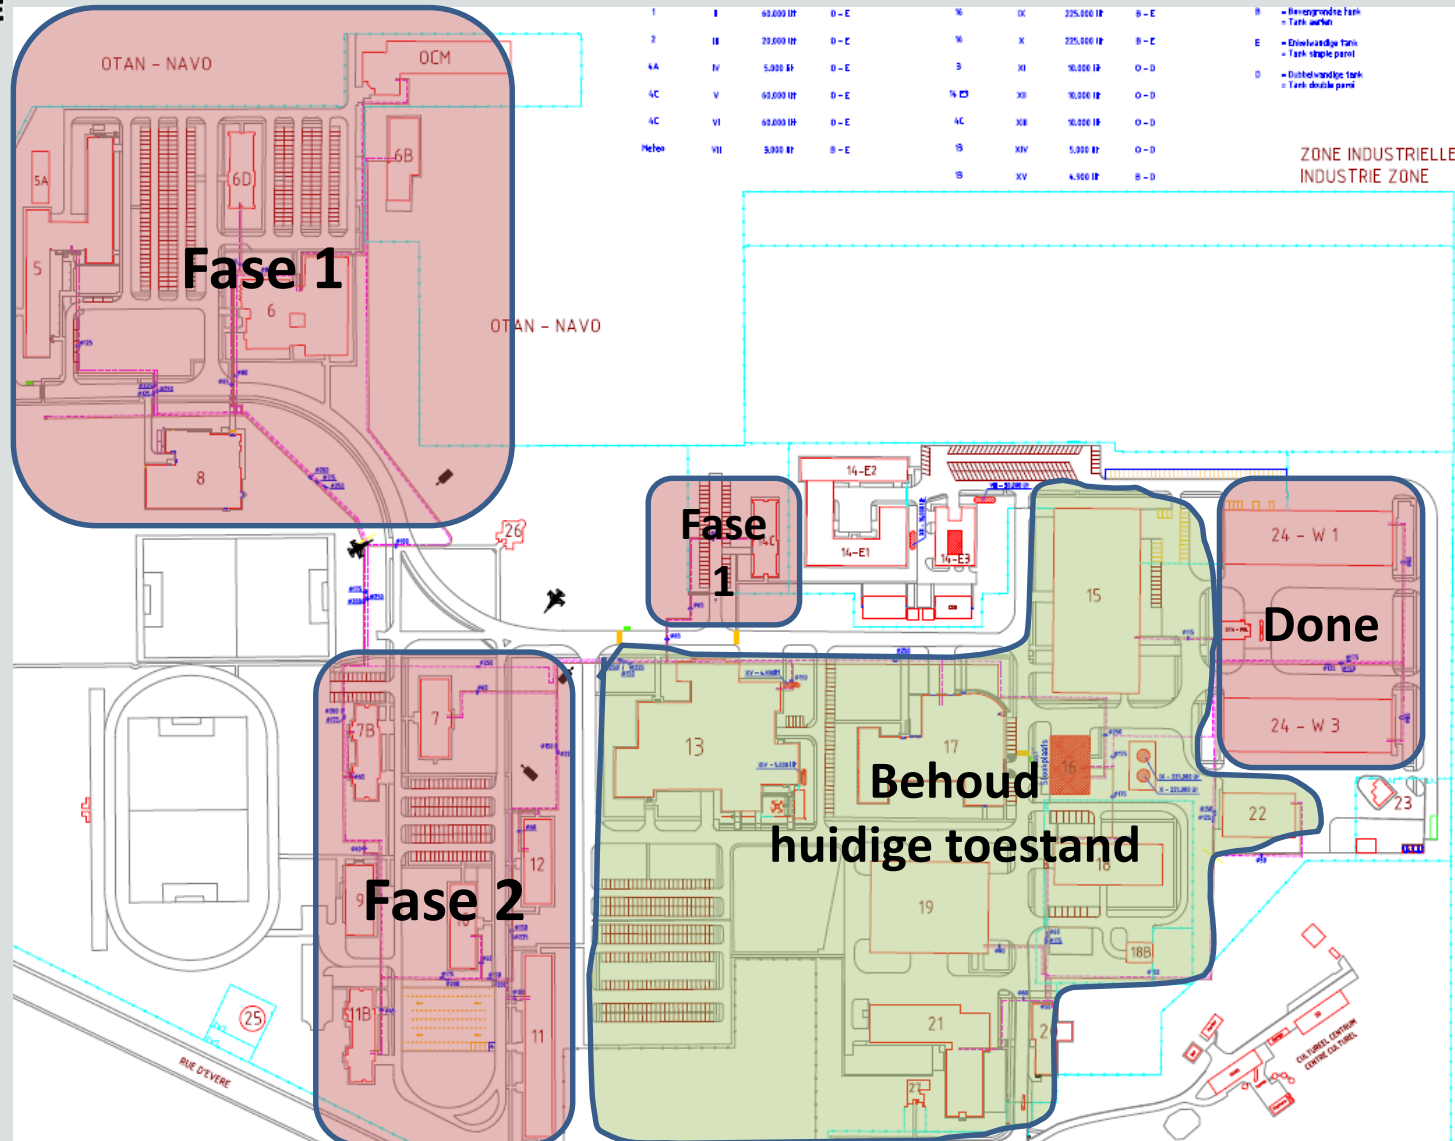

# Uitgevoerd

- Okt 20: afstoten deel van kring 1 (blok 24/26) thv StaPOL
- Verwarming blok 26 adhv mobiele stookplaats

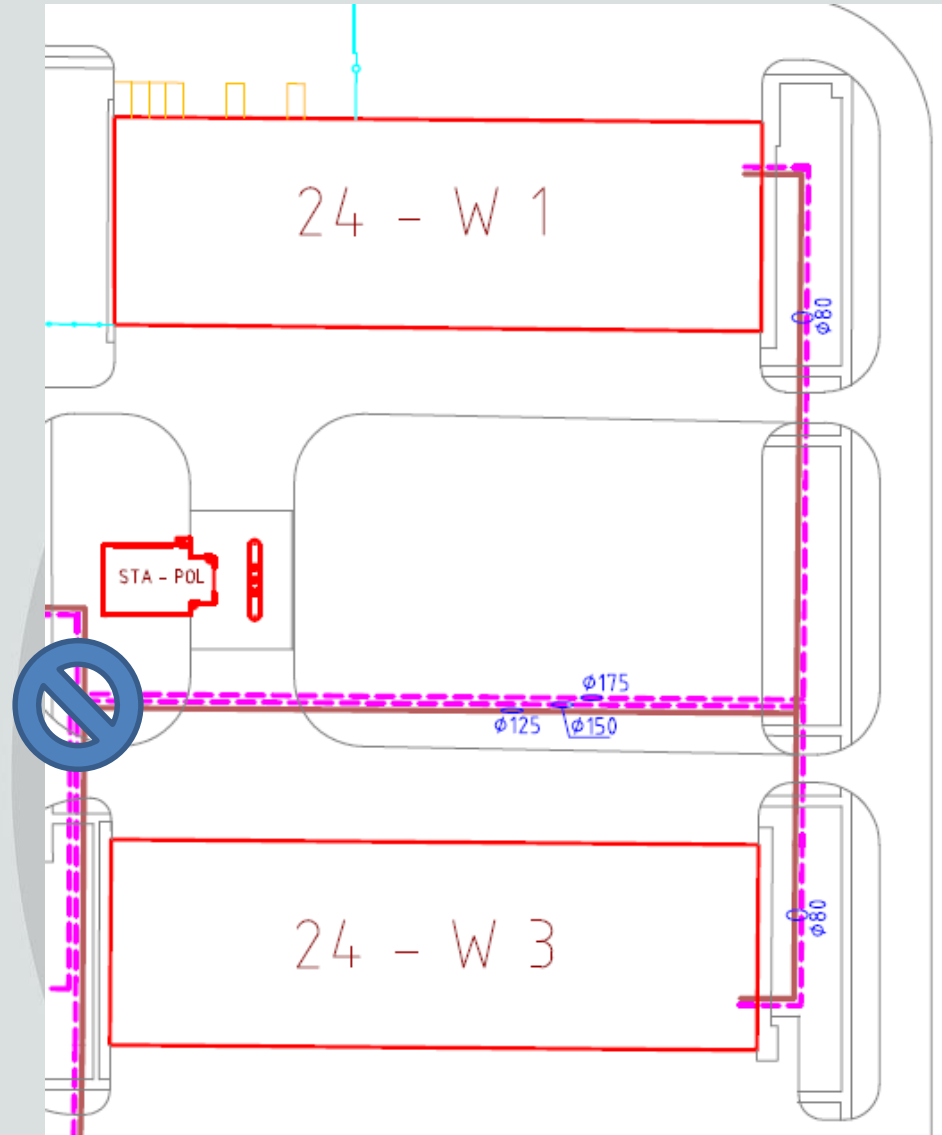




DEFENSIE  
LA DÉFENSE




# Fase 1: uitvoering 2021

- **Blok 5 / 6 / 6B / 6D / 8**
- Lokale vernieuwing ondergronds net (kost Defensie)
- Lengte (A+R) = +/-700m
- Geschatte kost = 200k€
- Huidig vermogen = 2MW
- Verwarming tot sluiting adhv mobiele stookplaats (kost TPF)
- **Blok OCM:** alternatief verwarmd (TBD)

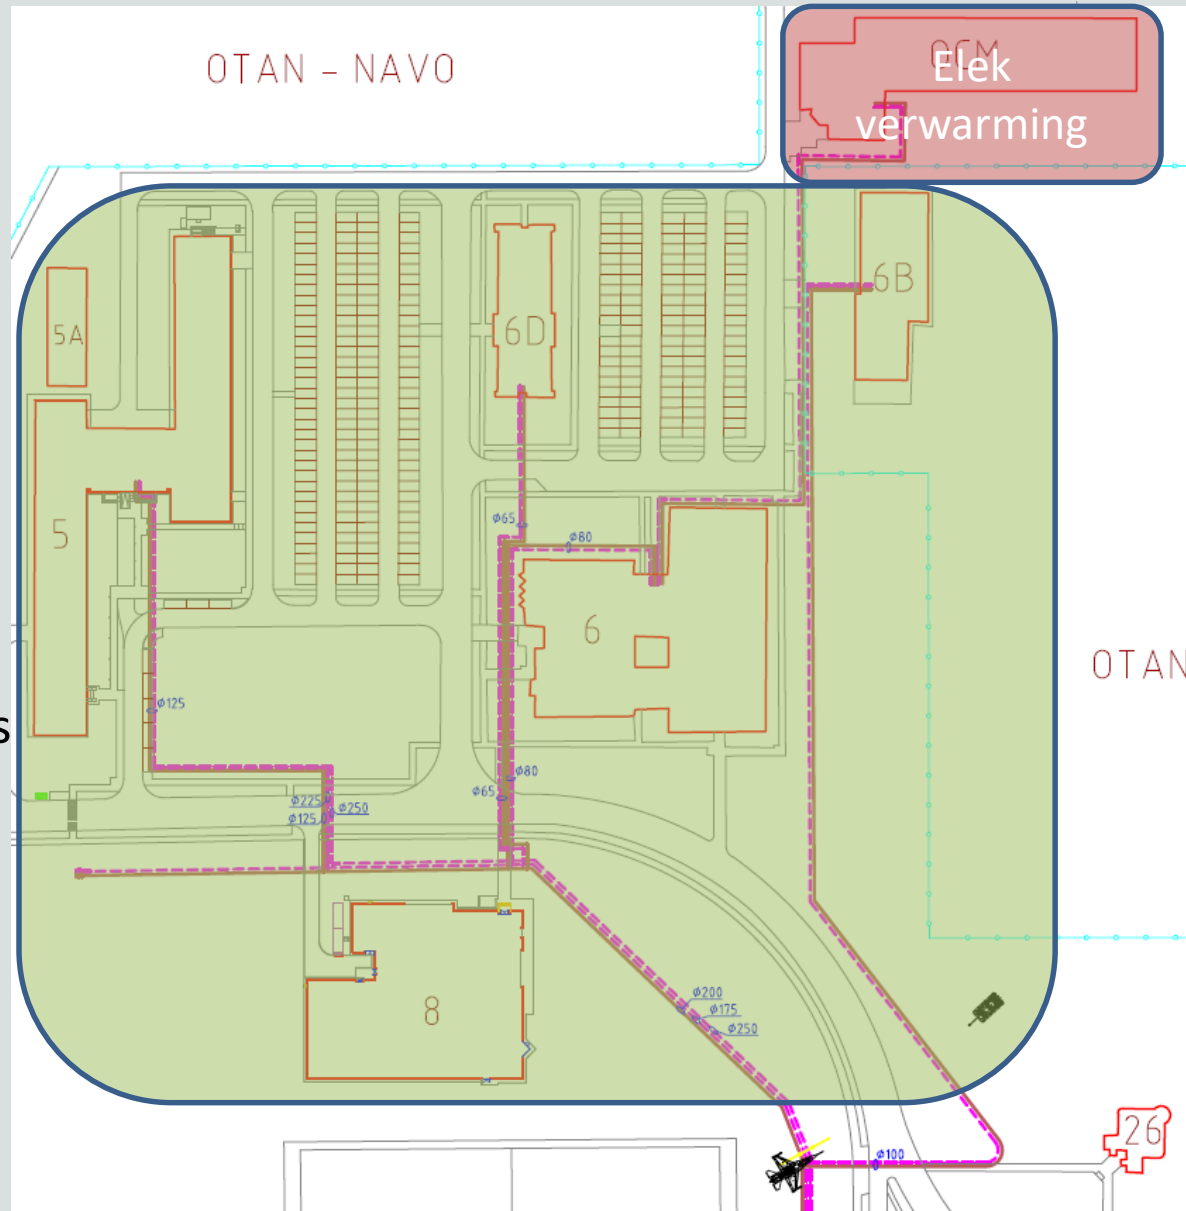




**DEFENSIE  
LA DÉFENSE**

 Mobilele stookplaats


 Retour

 Aanvoer

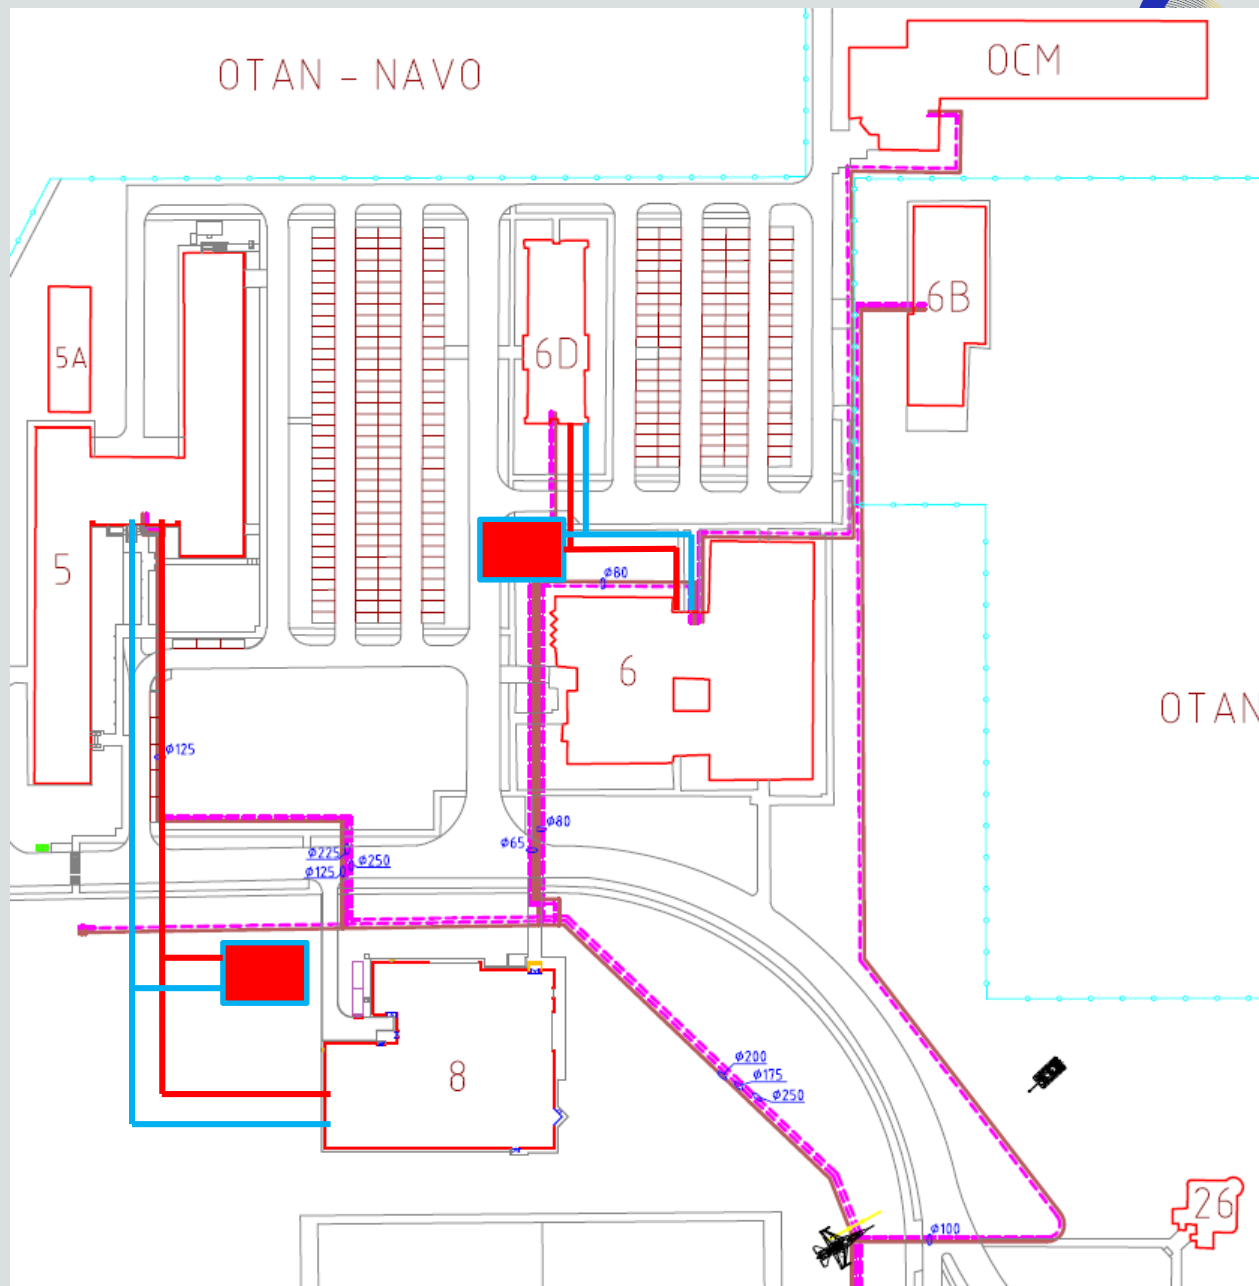

# Fase 1: uitvoering 2021

- **Blok 14C**
- Afkoppelen van kring 2
- Aansluiten op stookplaats blok 14 (evt. adhv bovengrondse leidingen)
- Geschatte kost = +/-50k€ (?); Huidig vermogen: 125kW

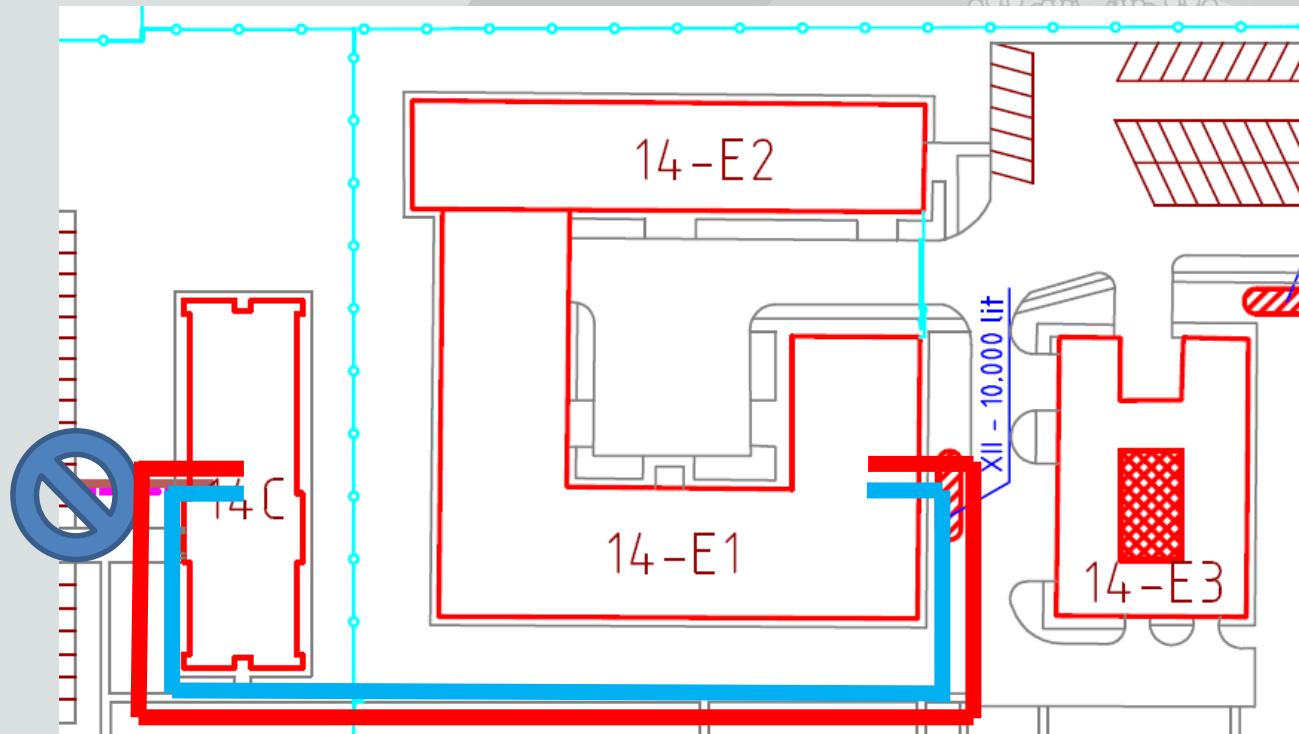




DEFENSIE  
LA DÉFENSE



## Fase 2: uitvoering 2022

- **Blok 7 / 7B / 9 / 10 / 11 / 11B / 12**
- Lokale vernieuwing ondergrondsnetwerk (kost Defensie)
- Lengte (A+R) = 700m
- Geschatte kost = 500k€
- Huidig vermogen = 1,2MW
- Verwarming tot sluiting KKE adhv mobiele stookplaats (kost TPF)

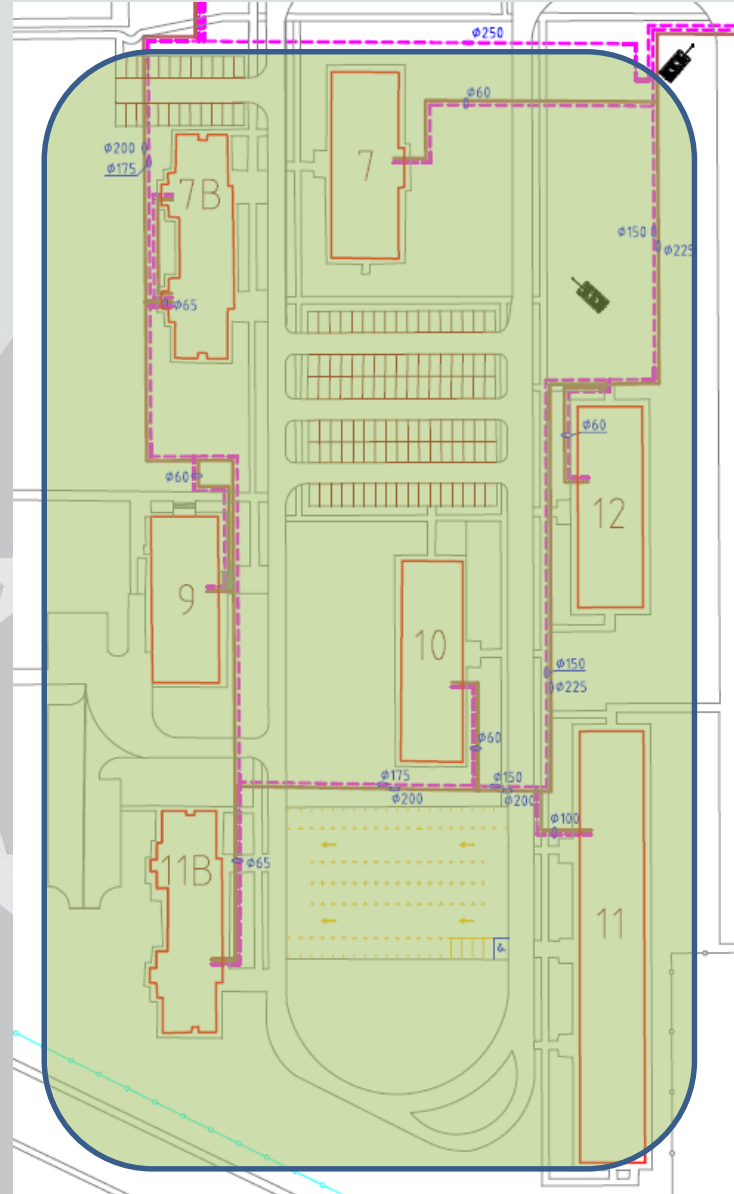





# AIL



1. Pk moto 4B-C à faire éclairer
2. PIU – Brandbestrijding Mat – Lijst + Ops



14

# QUESTIONS / VRAGEN





# Strooidienst



**WERKERS**  
IN ASSURING

**Fiche - Service Hivernal K.K.E. - EVERE**

**Coordonnées de contact**


Phone (work)	02/742.78.25	<b>GSM-SERVICE-HIVERNAL-</b> <b>0473/59.78.69</b> <small>(0473), 7 jours sur 7 (sauf le dimanche)</small>
(Vrijdag de下班)	0477/307571	
Corporate E-mail	02/742.78.25	
Marc Vanderhagen	0475/812303	
Jeanpaul Kalkbrenner	0475/21.21.00	
Walter Vanoverbeke	0487/78.75.05	
Linea de trabajo	0493/72.74.27	
Linea de trabajo	0493/21.06.33	
Appel	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La responsabilité d'Uture peut appeler à tout moment pour un épandage du site via le service de service hivernal</li> <li>✓ Épandage en cas de COVID-19</li> <li>✓ Une fois l'arrêt de l'épandage, il faut assurer la disponibilité des bases d'overhaul en des jours, heures</li> </ul>	
Chargement des véhicules	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'entretien des véhicules est de la responsabilité de l'exploitant</li> <li>✓ Vérifier que le site à l'heure de l'arrêt, en cas d'appel immédiat, dès que possible (délai de 20)</li> <li>✓ Les véhicules d'épandage et les déchets doivent être dans les zones qui leur sont assignées</li> </ul>	
Fin des travaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Après la fin des travaux, les résultats doivent être remis à la personne responsable à l'heure (corps de garde) que ces travaux sont terminés</li> <li>✓ Si le responsable d'Uture voit que les travaux sont terminés, il doit contacter le club</li> <li>✓ <b>Interdiction d'usage de machines</b></li> </ul>	



# Strooidienst – Week - Wegen



## QUARTIER REINE ELISABETH - KWARTIER KONINGIN ELISABETH EVERE

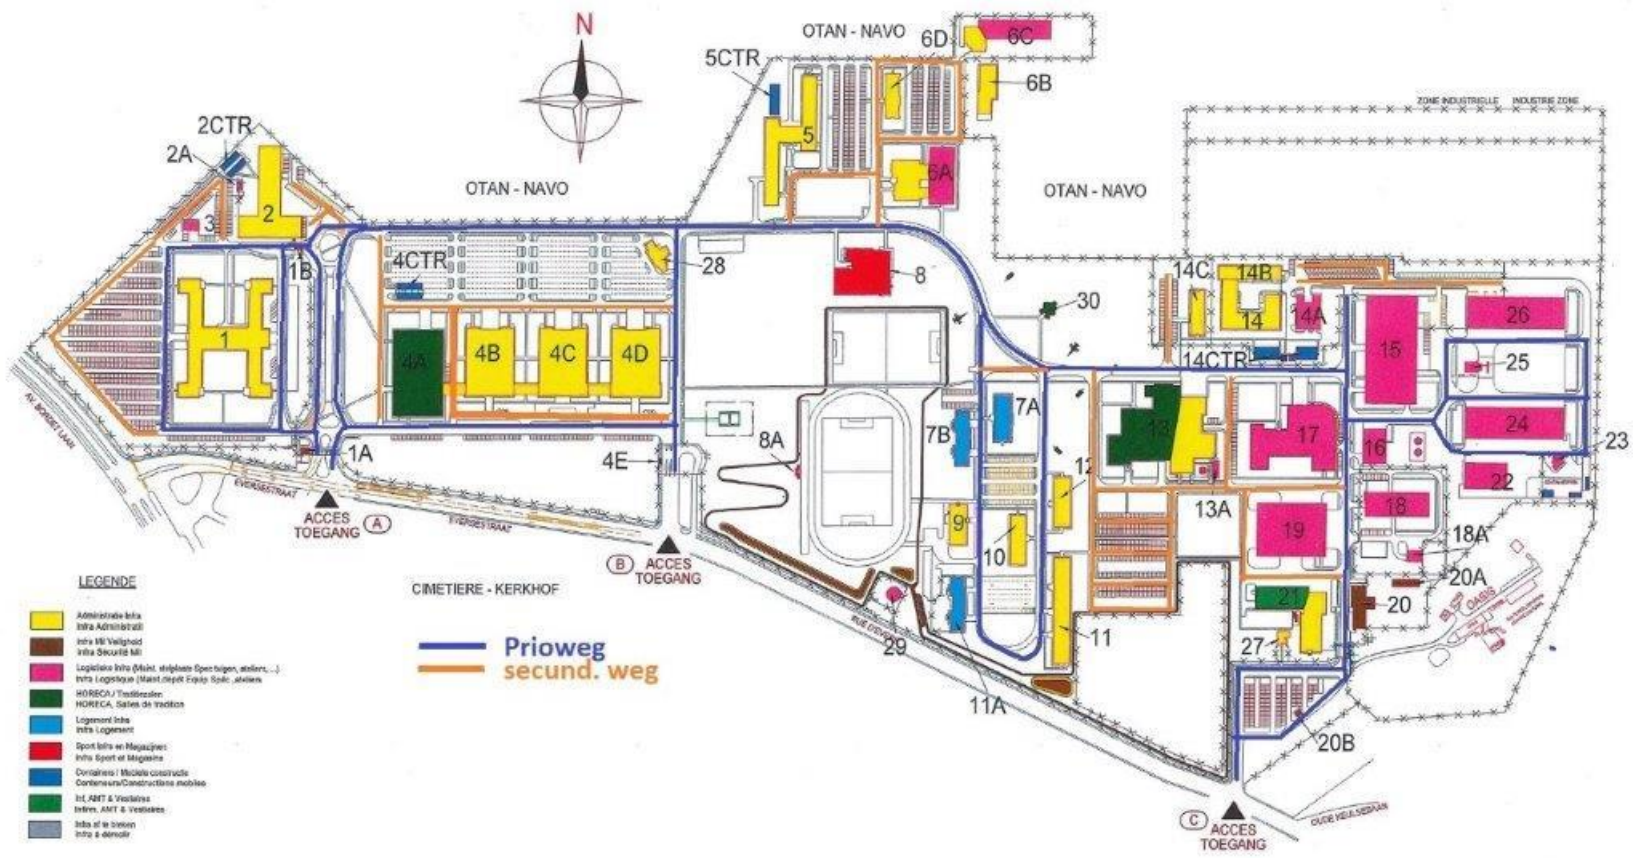




# Strooidienst – Week - Pk




## QUARTIER REINE ELISABETH - KWARTIER KONINGIN ELISABETH EVERE

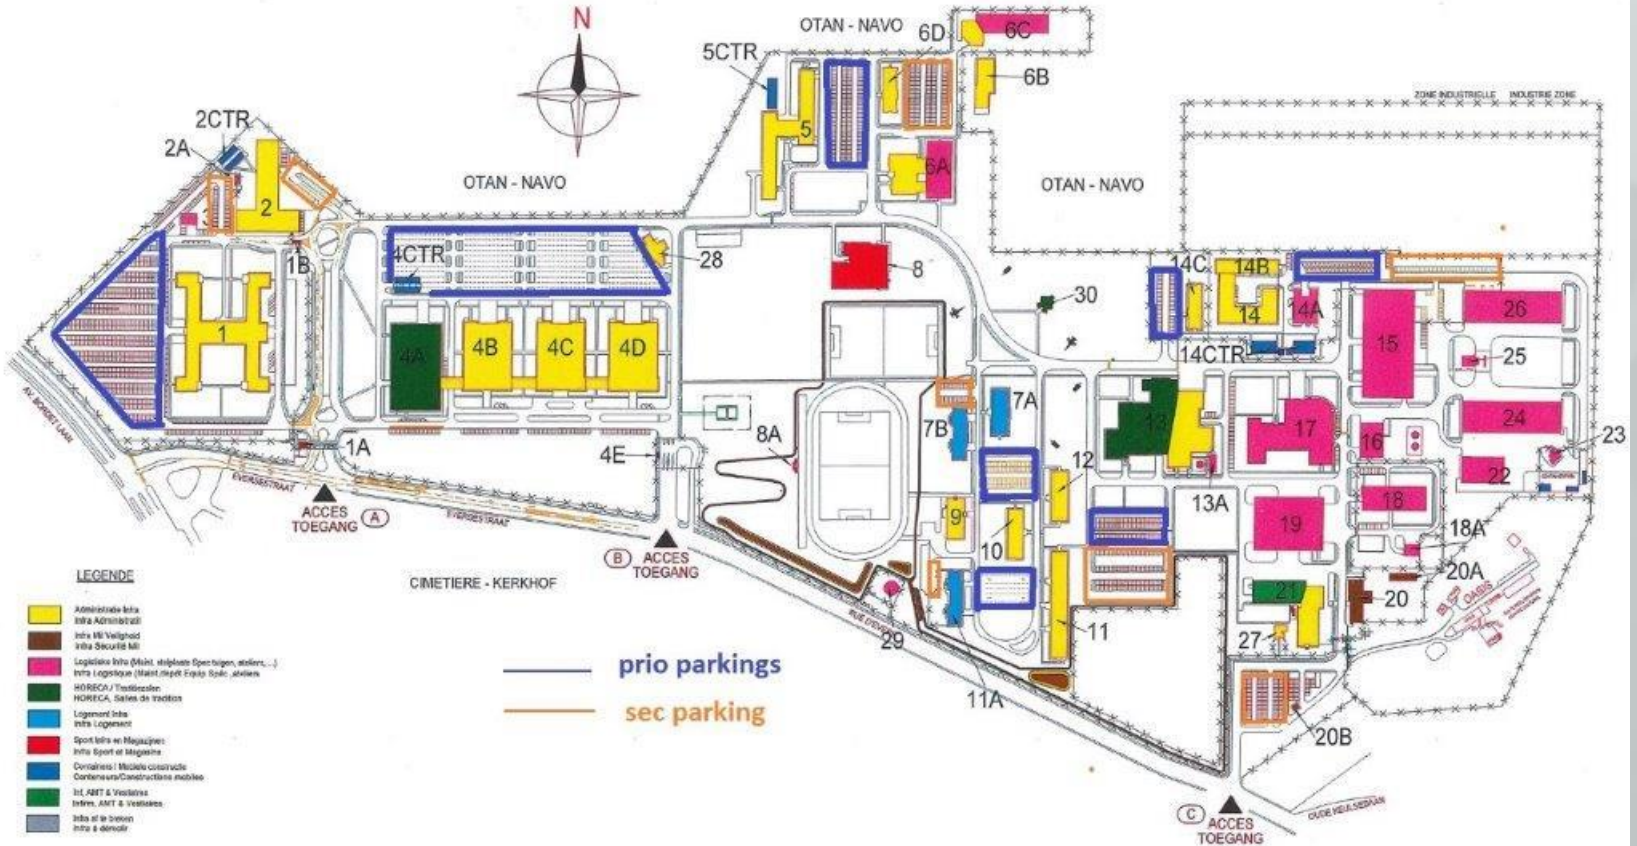



# Strooidienst – Week – Voetpaden

## QUARTIER REINE ELISABETH - KWARTIER KONINGIN ELISABETH EVERE

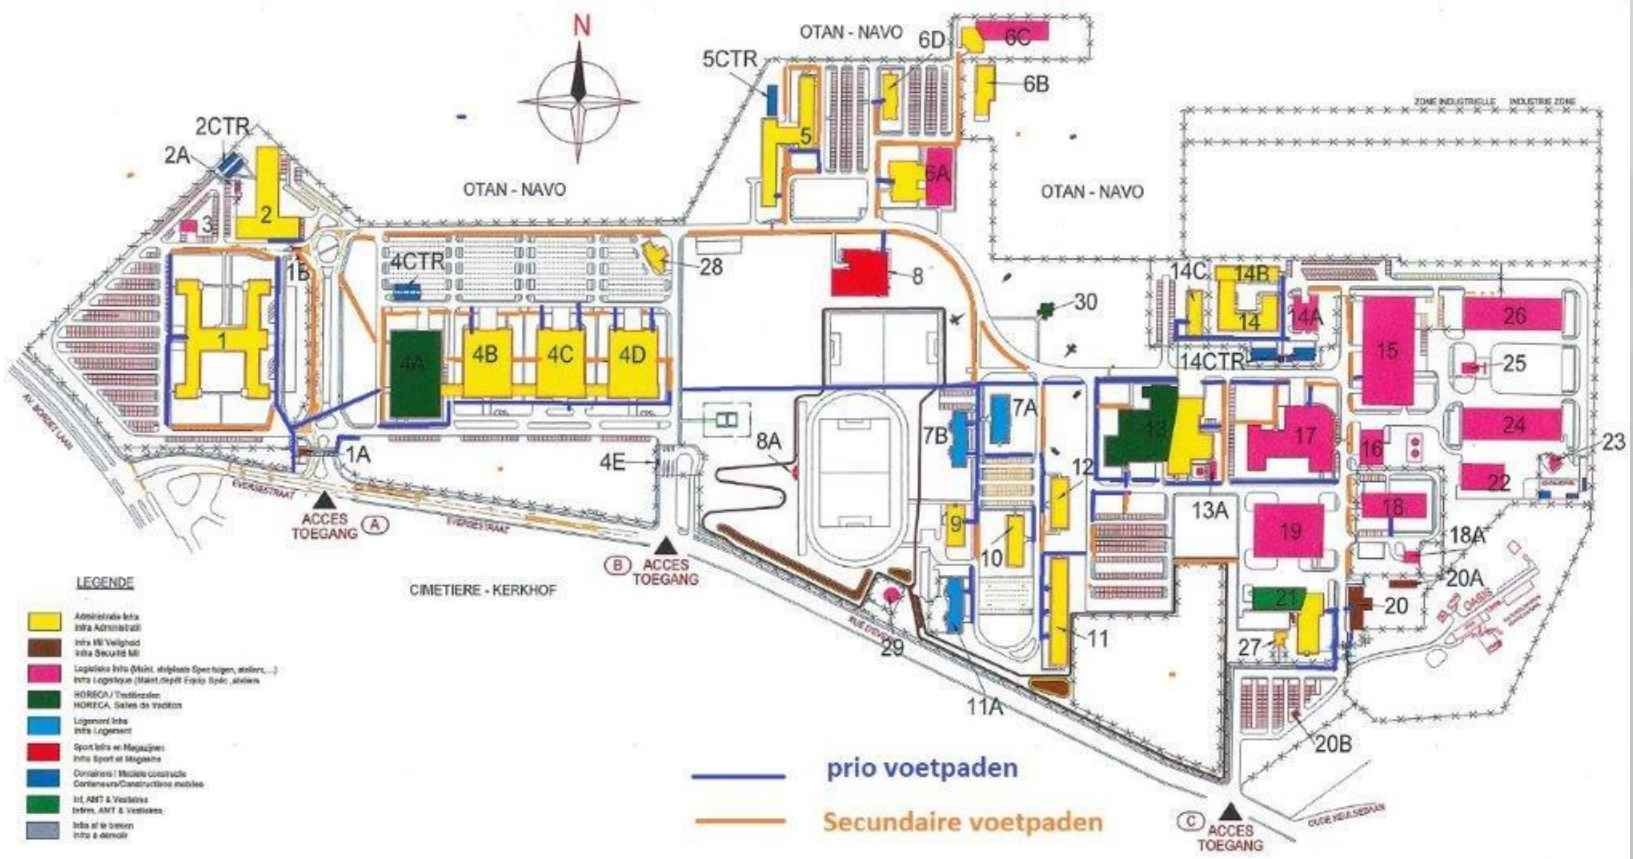



# Strooidienst - WE

## QUARTIER REINE ELISABETH - KWARTIER KONINGIN ELISABETH EVERE

